


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況

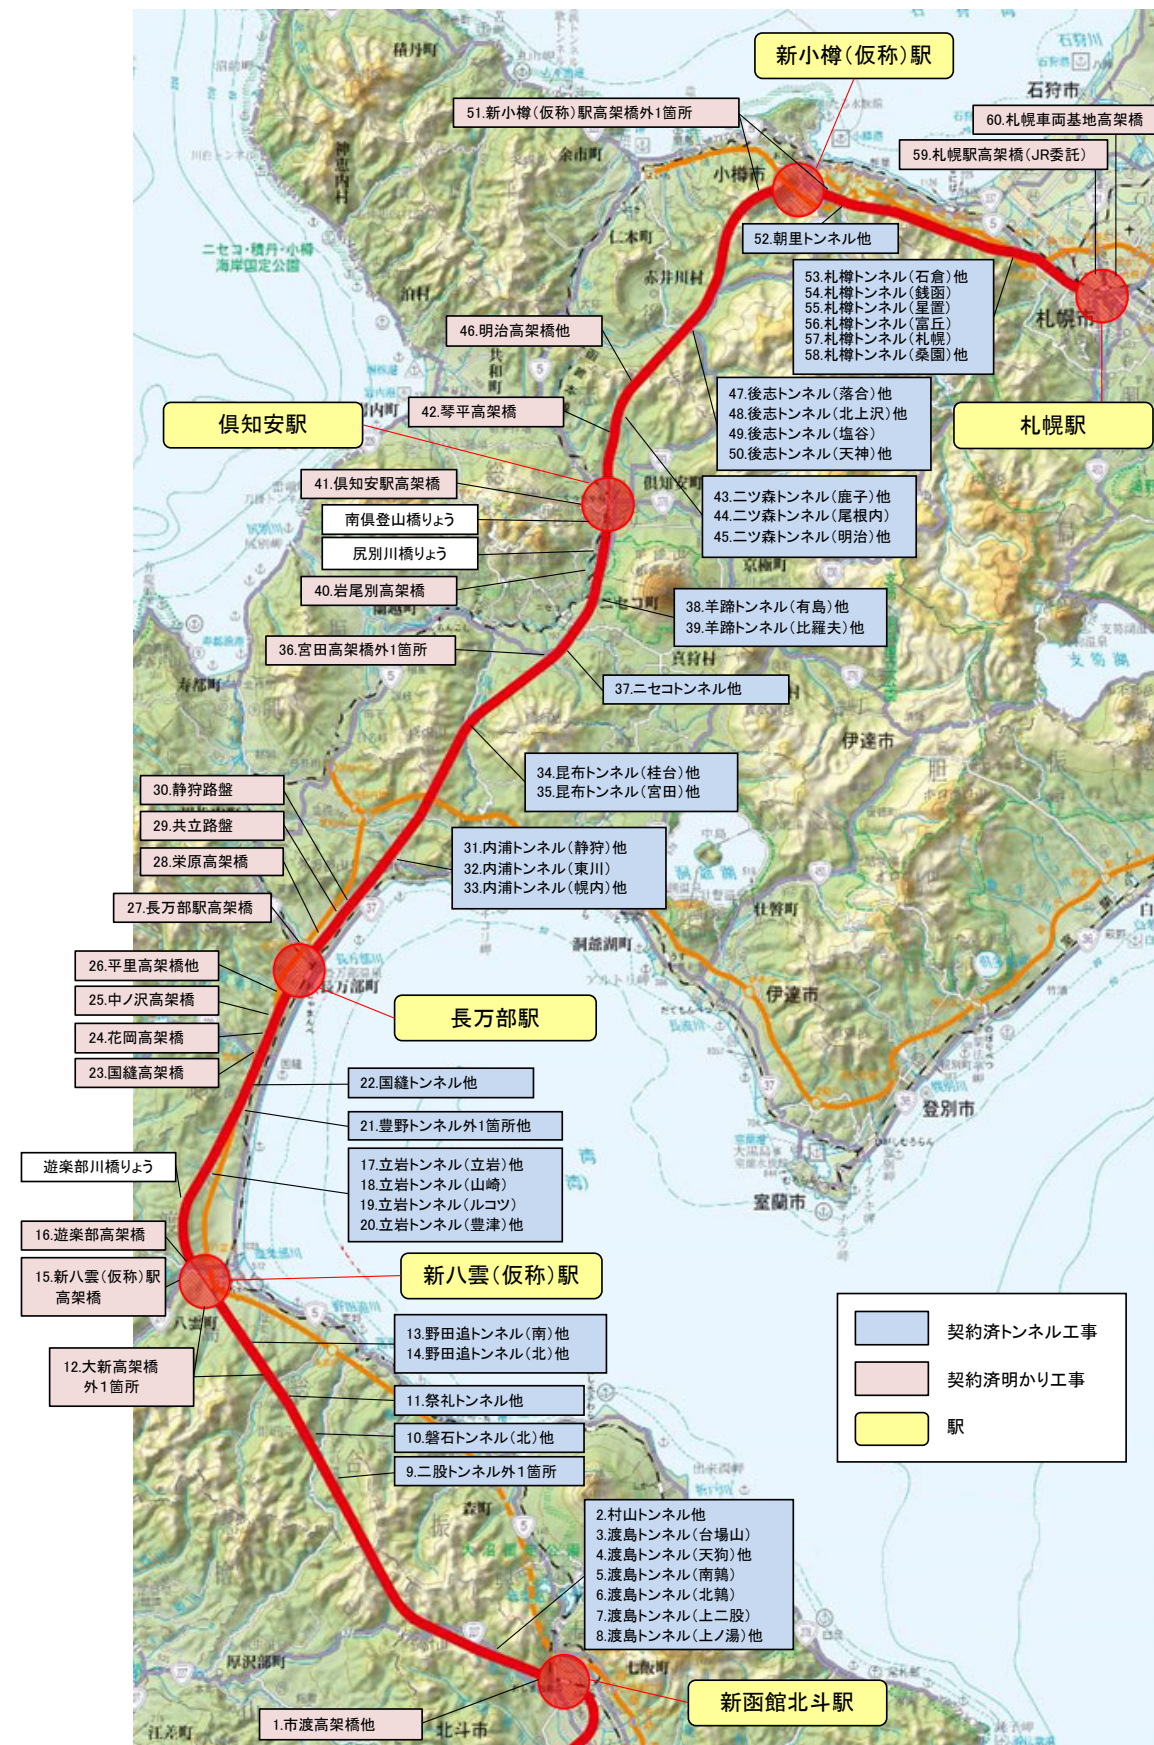

進捗率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	99%	75%

● 工事状況

本坑掘削完了	15工区
本坑掘削中	25工区
明かり工事施工中	19工区
準備中	1工区
計	60工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

トンネル工事進捗状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一体化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,330m	38%	489m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	3,638m	79%	2,037m	
5	渡島トンネル(南鶴)	3,900m	1,264m	32%	131m	
6	渡島トンネル(北鶴)	5,510m	5,028m	91%	3,605m	
7	渡島トンネル(上ノ湯)	4,540m	3,627m	80%	513m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,300m	3,845m	73%	3,215m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,931m	95%	2,220m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,863m	91%	1,894m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一体化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,775m	3,775m	100%	2,630m	
14	野田追トンネル(北)他	4,450m	4,169m	94%	3,402m	
17	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル(山崎)	4,960m	4,689m	95%	3,929m	
19	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	5,000m	100%	4,426m	
20	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	2,065m	100%	1,533m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	2,165m	100%	1,441m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	1,340m	
31	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	4,305m	77%	3,192m	
32	内浦トンネル(東川)	5,000m	2,712m	54%	1,383m	
33	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	5,000m	100%	4,594m	
34	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
35	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
37	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
38	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	2,464m	59%	1,041m	
39	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,605m	65%	2,540m	
43	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
44	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	4,032m	87%	2,429m	
45	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	1,421m	44%	615m	
47	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,775m	
48	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
49	後志トンネル(塩谷)	4,050m	2,805m	69%	288m	
50	後志トンネル(天神)他	4,460m	2,513m	56%	1,634m	
52	朝里トンネル他	4,328m	3,894m	90%	2,652m	
53	札樽トンネル(石倉)他	4,506m	1,833m	41%	0m	
54	札樽トンネル(銭函)	4,000m	1,211m	30%	0m	
55	札樽トンネル(星置)	4,400m	775m	18%	0m	
56	札樽トンネル(富丘)	4,500m	1,947m	43%	0m	
57	札樽トンネル(札幌)	8,446m	1,443m	17%	0m	
58	札樽トンネル(桑園)他	346m	116m	33%	0m	進捗率から求めた換算値
合計		168,926m	127,160m	-	91,575m	※1

明かり工事進捗状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋りょう工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	高架橋、橋脚基礎工事中
15	新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	高架橋、橋脚基礎工事中
16	遊楽部高架橋	1,083m	高架橋、橋脚基礎工事中
23	国縫高架橋	2,138m	高架橋、橋脚基礎工事中
24	花岡高架橋	2,639m	高架橋、橋脚基礎工事中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	高架橋、橋脚基礎工事中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋、橋脚工事中
27	長万部駅高架橋	2,319m	準備中
28	栄原高架橋	2,534m	高架橋、橋脚基礎工事中
29	共立路盤	3,921m	高架橋、橋脚基礎工事中
30	静狩路盤	4,390m	高架橋、橋脚工事中
36	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋、橋脚工事中
40	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋、橋脚基礎工事中
41	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋、橋脚工事中
42	琴平高架橋	3,395m	高架橋、橋脚基礎工事中
46	明治高架橋他	976m	高架橋、橋脚工事中
51	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	高架橋、橋脚基礎工事中
58	札樽トンネル(桑園)他	659m	高架橋、橋脚基礎工事中
59	札幌駅高架橋(JR委託)	799m	新幹線高架橋、在来線改修工事中
60	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋、橋脚工事中

設備工事進捗状況

No	工事種類	工区名	備考
61	軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中
62	軌道工事	渡島南軌道敷設	準備中

1.市渡高架橋他

高架橋工事状況




19.立岩トンネル(ルコツ)

坑内状況



33.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況

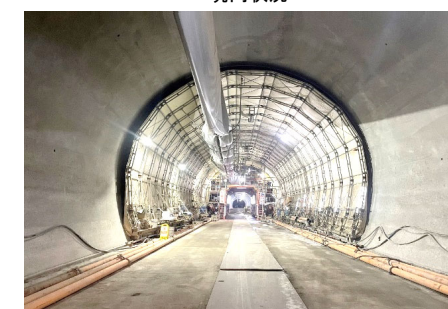

44.ニツ森トンネル(尾根内)

坑内状況



50.後志トンネル(天神)他

坑内状況

